ANM Agência Nacional de Mineração

GUIA PARA GERENCIAMENTO DE PROJETOS

AGÊNCIA NACIONAL DE MINERAÇÃO

DIRETORIA COLEGIADA

MAURO HENRIQUE MOREIRA SOUSA
DIRETOR-GERAL

CAIO MARIO TRIVELLATO SEABRA FILHO
GUILHERME SANTANA LOPES GOMES
ROGER ROMAO CABRAL
TASSO MENDONÇA JUNIOR
DIRETORES

ELABORAÇÃO TÉCNICA

SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA

CASSIO CARVALHAES
CRISTINE HORTÊNCIA COUTINHO PONTES
EMANUELLA BARRETO COSTA
JOSÉ CEZÁRIO MARIANO JUNIOR
JÚLIO CÉSAR MELLO RODRIGUES
LUIZ PAULO BEGHELLI JUNIOR
MARCELO BARONE
MÁRCIA APARECIDA DOS REIS POLCK
MARIANA MARTINO CALDEIRA
MARYANNA BESERRA DE ALMEIDA

SUMÁRIO

INTRODUÇÃO 4
O QUE É UM PROJETO? 5
O QUE NÃO PODE FALTAR EM UM PROJETO? 6
OBJETIVO, PRODUTO, RECURSOS E ATIVIDADES 6
PREMISSAS, RESTRIÇÕES 6
ÁREAS DE CONHECIMENTO EM UM PROJETO 7
PARTES INTERESSADAS: ATORES E SUAS FUNÇÕES ..... 10~~9~~
TEMPO, CUSTO, RECURSOS HUMANOS ..... 11~~10~~
RISCOS ..... 12~~11~~
AVALIAR MATURIDADE DO PROJETO ..... 14~~13~~
CICLO DE VIDA DE GERENCIAMENTO DO PROJETO ..... 15~~14~~
COMO TRATAR AS ETAPAS DE GERENCIAMENTO DE PROJETO NA ANM? ..... 18~~16~~
PROJETOS NO CONTEXTO DOS PLANOS EXECUTIVOS E DO PORTFÓLIO ANM ..... 21~~19~~
CONSIDERAÇÕES FINAIS ..... 22~~20~~

INTRODUÇÃO

A ANM, por meio de seu Plano Estratégico, definiu, em trabalho conjunto de todas as suas áreas, a forma como pretende ser vista pela sociedade no futuro (Visão), bem como os caminhos que pretende trilhar para alcançar este cenário que é o cumprimento de sua Missão, traduzida pelos seus Objetivos Estratégicos.

Tal abordagem se apresenta como indispensável na busca do aprimoramento da organização, na medida em que permite implementar soluções de melhoria de forma paralela à sua operação diária. Caso contrário, a atuação da organização se fundamentaria basicamente no atendimento do dia a dia, sem foco nas ações de melhoria.

Neste sentido, a estruturação de projetos é disciplina indispensável para o atendimento deste processo de melhoria contínua e perpassa toda a instituição, de forma que cada servidor e colaborador tornam-se responsáveis por defender o acompanhamento sistemático e o gerenciamento contínuo de Projetos Institucionais.

O Guia para Gerenciamento de Projetos da ANM representa a continuidade de melhorias necessárias para a manutenção da estratégia, sustenta os avanços da organização e reforça o respeito às diretrizes estratégicas da Agência.

Esse instrumento apresenta os conceitos importantes para o gerenciamento de projetos e as boas práticas necessárias, dando suporte à metodologia adotada pela Agência, com as ferramentas e artefatos adaptados à realidade da ANM, que serão usados em projetos priorizados por ocasião do portfólio aprovado.

A integração de conceitos nesse guia servirá de base para a gestão das iniciativas consideradas estratégicas pela alta gestão da Agência, visando padronizar o gerenciamento dos projetos prioritários, assim como orientar na elaboração de um projeto com chances de sucesso.

MINUTA

O QUE É UM PROJETO?

Um **projeto** é um esforço que não se repete, com início e fim definidos, para atingir um objetivo. Essa condição aumenta as perspectivas de sucesso e diminui as possíveis dúvidas que surgem no decorrer do projeto. Além disso, um projeto deve entregar um produto, serviço ou resultado único.

Não podemos confundir projetos com **processos**, visto que, de modo inverso, processos são operações repetitivas, sem entrega de um produto único. Enquanto projetos são temporários, com produtos inéditos, processos remetem às ações contínuas e produzem produtos, serviços ou resultados repetitivos, sendo ações cotidianas.

Pensando em uma classificação, a partir da natureza dos projetos, foram propostos já na metodologia de portfólio, os tipos de projetos da ANM:

- Crescimento / Manutenção / Estruturante: É a categoria de projeto cujas entregas finais contribuem consideravelmente com os objetivos de construção dos planos diretores no nível tático ou com as ações do Plano de Gestão no nível operacional. Um projeto estruturante, por exemplo, é aquele que precede ações futuras de inovação.

- Transformação / Inovação: O ato ou ação de inovar está em destaque, visando modificar hábitos, ideias, serviços, ferramentas, sistemas, legislações e processos, em função da necessidade de gerar meios diferentes, a fim de trazer maior valor agregado e diferenciado.

- Gestão de Pessoas: São projetos que objetivam o desenvolvimento do capital humano na instituição.

- Eficiência Operacional / Evolução: Está relacionado à melhoria de desempenho de serviços de forma geral, num patamar de manutenção com pequenos ganhos/evoluções.

- Mandatório / de Conformidade: São projetos que não possuem alternativas à sua execução, por serem motivados por questões legais e com tempo pré-determinado de entrega.

Um projeto pode se encaixar em mais de um dos tipos acima, porém, inicialmente e para fins de classificação, será considerado apenas aquele que mais confere característica ao projeto. Esses tipos de projetos comporão a capacidade ANM, que implica na quantidade de cada tipo de projeto possível de ser desenvolvido em um determinado período de tempo.

MINUTA

O QUE NÃO PODE FALTAR EM UM PROJETO?

Alguns elementos são essenciais para se definir um projeto. Independentemente da metodologia a ser adotada, é essencial, para uma gestão de portfólio, o monitoramento de determinados aspectos dos projetos. São eles que dão corpo, volume, crítica à existência do projeto, fazendo com que seja ultrapassada a simples ideia de se querer fazer algo.

OBJETIVO, PRODUTO, RECURSOS E ATIVIDADES

O **objetivo** de um projeto pode ser entendido como a repercussão (impacto) que ele pretende ocasionar na instituição, sendo algo sentido de médio a longo prazo. Todavia, o **produto** é o resultado palpável, também sendo entendido como entrega do projeto.

Quando se fala em **recursos** de um projeto, estão incluídos não apenas as pessoas (recursos humanos) que irão participar do projeto, mas também materiais, sistemas, instalações e equipamentos que são utilizados para desempenhar as atividades ou ações que precisam ser executadas para gerar algo do projeto.

PREMISSAS, RESTRIÇÕES

Uma **premissa** é uma hipótese considerada verdadeira pela equipe de projeto, mesmo sem uma prova concreta, pois normalmente dependem de fatores externos. Essas suposições podem afetar o planejamento do projeto, visto que podem ocorrer imprevistos. Como exemplo, a previsão da compra de um equipamento importado, cuja moeda é o dólar, sendo que o orçamento da organização foi estipulado em reais, ou seja, está supondo que a moeda estrangeira **não terá um aumento substancial** durante a execução do projeto. Outras premissas: assunção de que não haverá chuva em determinados meses da obra, e

MINUTA

que, portanto, **não haverá impacto pelo clima**; num projeto de design, a equipe assumirá que o cliente deverá gostar do design em sua primeira versão, ou seja, não haverá um plano B.

Já as **restrições** são limitações colocadas no projeto a ser executado. Como exemplo, é possível citar as restrições orçamentárias, quando o recurso financeiro para o projeto é restrito a um certo valor máximo. Os fatores disponibilidade de equipe e tempo também costumam ser colocados como restrições de um projeto.

ÁREAS DE CONHECIMENTO EM UM PROJETO

No entendimento do PMBOK®[1], em gerenciamento de projetos, as áreas de conhecimento estão mostradas na Figura 1. Porém, ressalta-se que outras metodologias também entendem de forma semelhante, mas não apresentam processos de trabalho e/ou sugestões de artefatos para o tratamento de cada área de forma detalhada e em separado. Por fim, as áreas apresentadas abaixo são interrelacionadas, logo se uma área não for bem estudada e acompanhada, pode prejudicar o andamento do projeto como um todo.

MINUTA

[1] PMI. Um guia do conhecimento em gerenciamento de projetos. Guia **PMBOK®** 6a. ed. – EUA: Project Management Institute, 2017. • BORGES,. Carlos;. ROLLIM,.

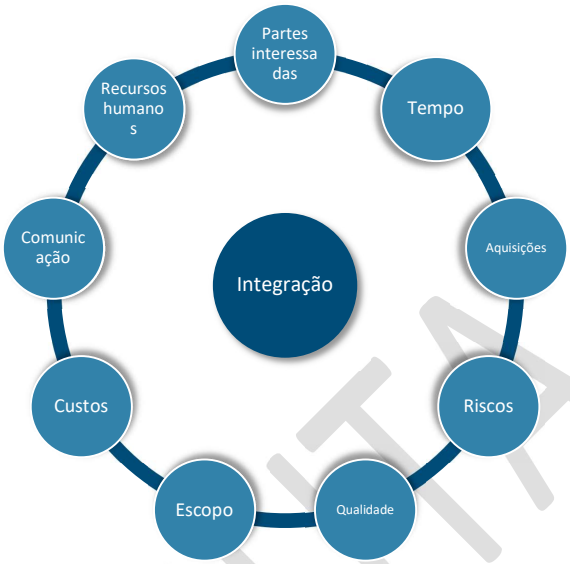
Partes interessadas
Tempo
Aquisições
Riscos
Qualidade
Escopo
Custos
Comunicação
Recursos humanos
Integração

MINUTA

Figura 1: Áreas do conhecimento em Gerenciamento de Projetos.

Segue, de forma objetiva, o que se espera de cada uma das áreas do conhecimento. Em seguida, foram descritas com mais detalhe algumas áreas que devem ser minimamente abordadas nos projetos institucionais da ANM.

- **Integração**: Inclui os processos necessários para identificar, definir, ajustar, combinar, unificar e coordenar as atividades de gerenciamento de projetos.
- **Partes Interessadas**: Identifica pessoas, grupos e organizações que podem impactar ou ser impactadas pelo projeto, analisando suas expectativas, auxilia nas estratégias de engajamento nas decisões e execução. Identifica possíveis problemas entre as partes.
- **Tempo**: Compreende as atividades que consistem gerir os processos essenciais para finalizar o projeto no prazo estipulado.
- **Aquisições:** Abrange as ações necessárias para comprar ou adquirir produtos, serviços ou resultados externos à equipe do projeto.
- **Riscos:** Incorpora os processos de planejamento de respostas, identificação, análise, monitoramento e controle de riscos de um projeto, a fim de reduzir as chances de acontecimentos negativos e seus impactos, além de elevar os benefícios das possíveis oportunidades.
- **Qualidade:** Envolve os processos comprometidos na garantia da satisfação dos objetivos do projeto. É importante compreender as necessidades das partes interessadas, identificando padrões de qualidade relevantes, analisando as metas e indicadores que devem ser monitorados.
- **Escopo:** Abrange todo o trabalho que precisa ser realizado e apenas o necessário para que o projeto chegue ao final.
- **Custos:** Inclui as estimativas, orçamentos e controle de gastos para que o projeto seja realizado de acordo com o orçamento que foi aprovado.
- **Comunicação:** Abarca as atividades que garantem que informações do projeto sejam planejadas, geradas, coletadas, distribuídas, armazenadas, recuperadas e organizadas de forma certa.
- **Recursos Humanos:** Contempla as ações que organiza e gerencia a equipe do projeto, definindo o papel e monitorando o desempenho de cada um. Também inclui contratações externas, se for o caso.

MINUTA

PARTES INTERESSADAS: ATORES E SUAS FUNÇÕES

As partes interessadas são as pessoas, grupos e/ou organizações que podem impactar ou serem impactadas pelo projeto (Figura 2). Elas estão envolvidas no projeto de alguma maneira: de forma ativa, ou por possuírem interesses no(s) produto(s) do projeto, ou até pela influência que podem exercer de forma negativa.

Figura 2: Partes Interessadas de um Projeto.

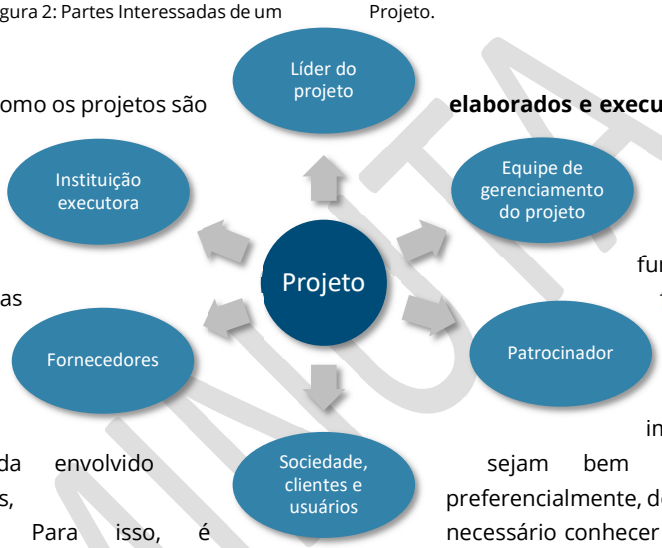

Como os projetos são **elaborados e executados por pessoas**, é fundamental que as funções e a importância de cada envolvido sejam bem claras e definidas, preferencialmente, de **maneira formal**. Para isso, é necessário conhecer quem são os atores, o que eles necessitam, esperam, e o grau de influência que exercem sobre o projeto, para facilitar a relação com todos (Figura 3).

ATORES	DESCRIÇÃO
LÍDER/GERENTE DO PROJETO	Pessoa responsável pelo gerenciamento do projeto, designada pela instituição. Deve ser responsável pela comunicação com as partes interessadas.
EQUIPE DO PROJETO	Constituída pela equipe de gerenciamento de projetos, pelo líder/gerente de projetos e por outros integrantes da equipe que executam as atividades relacionadas. Equipe de projetos = Equipe de gerenciamento de projetos + gerente de projetos + outros integrantes
PATROCINADOR	Indivíduo ou grupo que possui influência para auxiliar o projeto de alguma maneira, provendo recursos e/ou apoio político.

MINUTA

	Ele defende o projeto, inclusive na alta gestão.
INSTITUIÇÃO EXECUTORA	Instituição responsável pelo planejamento e execução do projeto.
FORNECEDORES	Pessoa física ou jurídica de fora da instituição que executa o projeto. Eles entregam produtos ou serviços que serão utilizados no projeto.
SOCIEDADE, CLIENTE E USUÁRIOS	Pessoa, grupo ou organização que utilizará o resultado do projeto.

Figura 3: Quadro com os atores de um projeto e suas respectivas descrições.

TEMPO, CUSTO, RECURSOS HUMANOS

O gerenciamento do **tempo** num projeto implica em administrar todas as tarefas em todas as etapas e mensurar a energia (recurso humano) e tempo para finalizar o projeto no prazo estipulado. Para tal, é necessário muita organização e um bom e eficaz monitoramento.

Para assegurar que um projeto seja finalizado e os produtos entregues com o orçamento planejado é necessário gerenciar os **custos** do projeto, a partir de um recurso financeiro disponível e aprovado para o projeto.

A grande vantagem desse gerenciamento é ter a perspectiva geral de cada gasto realizado com cada etapa e atividade do projeto, facilitando assim, no controle e na comprovação das despesas.

O processo de gerenciamento de **custos** em projetos inclui:

a) Planejar o gerenciamento dos custos;
b) estimar os custos;
c) determinar o orçamento;
d) controlar os custos.

Equipes de Projetos são formadas pelas pessoas que atuam na realização de um projeto e que geralmente é liderada por um gerente de projetos no formato tradicional, preditivo.

Cada **equipe** geralmente possui um gerente de projeto, os membros da equipe e um patrocinador. Todavia, como cada projeto possui um tamanho e escopo, e, com isso, os gestores devem adequar a equipe de acordo com as especificidades de cada projeto.

MINUTA

Todavia, em uma equipe ágil, o proprietário do produto (*Product Owner* – PO) é o que tem a maior responsabilidade sobre a entrega do produto e, portanto, comanda uma equipe, dizendo a ela o que deve ser entregue e quando. A equipe é totalmente flexível e responsiva para atender aos anseios do PO. Por outro lado, temos o *Scrum Master,* que é um mestre de cerimônias, por saber todo o rito do método ágil. Ele gerencia o projeto, garantindo que todas as regras ágeis sejam cumpridas.

RISCOS

Um risco é definido como um evento incerto, que se ocorrer, poderá causar um efeito negativo em determinado objetivo. Identificar os riscos de um projeto é uma tarefa de extrema importância durante sua elaboração. Isto, porque a avaliação de riscos traz uma visão holística sobre o cenário em que o projeto está inserido.

No cenário de projetos, um risco irá representar, por exemplo, o atraso da própria execução do projeto, ou mesmo acabar com os recursos financeiros antes do término. Assim, o objetivo do gerenciamento dos riscos é o de, por meio do planejamento, garantir o alcance de determinado objetivo mesmo que o risco se materialize, garantindo que o projeto tenha sucesso.

Para se realizar a correta identificação dos riscos é preciso saber que o projeto tem um objetivo geral, que é a razão de sua própria construção, porém, para se alcançar este objetivo é precedida uma série de etapas com objetivos menores. O PMBOK®[2] define esses riscos como:

- **risco geral do projeto:** é o risco de o projeto não ocorrer dentro no macro cenário que está inserido; e
- **risco individual do projeto:** são os riscos que afetam as demais etapas que constituem o projeto.

O risco geral do projeto é levado em consideração para a priorização dos projetos, conforme metodologia apresentada no documento Guia de Portifólio de Projetos (inserir link). Aqui, o **foco** é o gerenciamento do **risco individual** de projeto.

[2] PMI. Um guia do conhecimento em gerenciamento de projetos. Guia **PMBOK**® 6a. ed. – EUA: Project Management Institute, 2017. • BORGES,. Carlos;. ROLLIM,.

MINUTA

Para ilustrar vamos utilizar o seguinte exemplo, se eu tenho que me deslocar até o aeroporto devo considerar uma série de fatores para planejar e ter segurança que o meu objetivo será alcançado. Assim, levarei em conta a rota, o dia, o horário e o modo de deslocamento para ter certeza de que chegarei a tempo. O mesmo deve ser feito ao se planejar um projeto, para seu desenvolvimento eu preciso de uma equipe de quantas pessoas? O que eu poderei fazer se durante seu desenvolvimento alguém entrar em licença?

Destacamos aqui as principais fontes de risco que podem afetar as etapas de desenvolvimento de um projeto (Figura 4):

CAUSA DE RISCO = FONTE DE RISCO + FRAGILIDADE

FONTE DE RISCO	FRAGILIDADE
Pessoa	Baixa capacitação, desmotivação, corrupção, falta de pessoal, sobrecarga
Processo	Ineficiente, mal estruturado, redundante
Sistema	Obsoleto, incompatível, baixa segurança, não se comunica com outros
Tecnologia	Alto custo, alta complexidade, baixa acessibilidade, ultrapassada
Infraestrutura	Inadequada, precária, insuficiência orçamentária
Evento externo	Influências políticas, crises econômicas, desastres ambientais

Figura 4: Quadro com Causa de risco.

MINUTA

Dentre os riscos levantados, que podem ser vários para o mesmo projeto, devemos considerar os mais iminentes e/ou graves para receberem tratamento. O que isso quer dizer? Tratar o risco significa procurar alternativas para que o risco não ocorra e para que caso ocorra, suas consequências sejam minimizadas. Por sua vez, um monitoramento deve ser mantido em todo o desenrolar do projeto.

Vamos supor que está em construção o seguinte projeto: Desenvolvimento e implementação de um sistema para monitoramento de riscos. O risco geral do projeto pode ser, por exemplo, receber sanções dos órgãos de controle por não monitorar os riscos da ANM. Já um dos riscos individuais poderá ser o de insuficiência orçamentária para o desenvolvimento do sistema. Nesse caso, considerando que esse é um risco iminente, que **ações poderão ser tomadas** para garantir o alcance do meu objetivo? Posso procurar parcerias e acordos com outros

órgãos da Administração Pública? Posso simplificar o produto a ser entregue? Essa busca de possíveis soluções constitui a etapa do gerenciamento do risco.

É importante ressaltar que o monitoramento desse risco deve ser feito de forma constante pelos responsáveis pelo projeto e/ou suas etapas. Pois, estes que terão maior domínio sobre o cenário, possíveis tratamentos e cronograma para a entrega do produto.

Abaixo vamos mostrar um exemplo (Figura 5) que poderá ser seguido para facilitar o gerenciamento dos riscos de projeto de implementação da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais:

ETAPAS DO PROJETO	OBJETIVO DA ETAPA	RISCO DA ETAPA	CLASSIFICAÇÃO DO RISCO	PLANO DE AÇÃO

Figura 5: Tratamento de risco no projeto.

No exemplo acima, estamos avaliando o risco que pode impedir, atrasar ou impactar de alguma forma o objetivo de cada etapa. Em seguida, a critério da área, são definidas as ações que podem diminuir os riscos de nível alto e médio, podendo ser mais de uma para cada risco, ou ainda tornar o risco uma oportunidade de alcance de entregas de valor do projeto.

AVALIAR MATURIDADE DO PROJETO

Os termos acima são pontos cruciais a serem considerados em projetos. E enquanto ANM, todo **projeto institucional** que compor o **portfólio da ANM** deve ser planejado levando-se em consideração o que **foi abordado**.

Ademais, entende-se que, em consonância com o que se espera de um projeto apto a fazer parte de um portfólio institucional, devem ser devidamente formalizadas no documento TERMO DE ABERTURA E CLASSIFICAÇÃO DE PROJETO os itens abaixo. A avaliação desses **itens**, bem como seu cumprimento, implica em aumentar as chances de sucesso do projeto, considerando questões básicas de preparação.

MINUTA

- disponibilidade orçamentária;

- equipe oficializada;

- alinhamento e clareza quanto aos objetivos estratégicos a serem alcançados;

- avaliação sobre entregas ou pré-requisitos existentes antes do início do projeto, considerando relação de precedência; e

- grau de transversalidade do projeto visto a organização da ANM.

Em adição aos itens acima, a avaliação sobre o **impacto** da não execução do projeto proposto, bem como da **urgência** de sua execução também devem ser abordados para melhor orientação e aplicação da metodologia de portfólio proposta pela área de projetos.

CICLO DE VIDA DE GERENCIAMENTO DO PROJETO

Cada projeto é algo diferenciado em si, e com a evolução e surgimento de novas formas de gerenciamento de projetos, entende-se que uma metodologia pode não atender 100% a necessidade de um projeto. Dessa forma, é natural a adoção de partes de metodologias de gerenciamento de projetos para adequação à realidade de cada projeto, com objetivo final de cumprir com a entrega de um produto.

Para melhor compreensão das metodologias de gerenciamento de projetos, a figura abaixo traz de forma resumida, características dos ciclos de vida considerando a abordagem preditiva ou clássica, de abordagem iterativa ou incremental, ou ainda adaptativo ou ágil (Figura 6). Na primeira forma, o produto é definido logo no início do projeto e de forma distinta; no ciclo de vida iterativo, são fases que vão incrementando o produto, enquanto, no ciclo de vida ágil, o produto se desenvolve e se adapta a partir de cada iteração.

MINUTA

PREDITIVO OU CLÁSSICO	ITERATIVO OU INCREMENTAL	ADAPTATIVO OU ÁGIL
✓ Orientados ao planejamento, ou seja, escopo, prazo e custo se determinam ainda na fase de planejamento e o projeto deve se moldar aos combinados iniciais. ✓ Caracteristicamente é organizado por fases sequenciais ou consecutivas ✓ Cria-se um novo plano de projeto, um gerenciamento em nível de escopo, toda vez há uma mudança de plano. ✓ Documentação pesada, o que toma muito tempo.	✓ Há a repetição de atividades do projeto em fases ou iterações, e cada uma dessas repetições, é acrescentado ao produto um novo entendimento por meio de novas funcionalidades. ✓ O processo de repetição busca reduzir falhas. ✓ Aqui o objetivo é pouco definido ou de alta complexidade.	✓ Estão relacionados aos altos níveis de mudança e participação contínua dos interessados. ✓ Escopo é confuso ✓ Contribuição de valor é mutante ✓ Típicos em ambientes que mudam rapidamente.

Figura 6: Quadro com as abordagens do ciclo de vida de um projeto.

Fonte: https://www.itmplatform.com/br/blog/ciclos-de-vida-preditivo-ou-classico-iterativo-e-incremental-adaptativo-ou-agil

A seguir, a Figura 7 indica como esses ciclos de vida são encarados por metodologia. Observar que na metodologia preditiva, é obrigatória a previsão de datas de início e fim e sujeito a novos planos por alteração de projeto. Para o ciclo iterativo, entende-se que a complexidade do produto final pode ser importante na definição de prazos que estarão atrelados a ciclos menores e repetitivos, e por tarefa. Por fim, o ciclo de vida ágil tende a enquadrar cada entrega ou grupo de entregas entre 1 e 4 semanas, porém, há que se entender que o que está em jogo é a flexibilidade na mudança a ser feita, caso necessário, e não em aprofundar e melhorar a característica do produto final.

ETAPAS DO CICLO DE VIDA DE GERENCIAMENTO DO PROJETO		
PREDITIVO	**ITERATIVO OU INCREMENTAL**	**ÁGIL OU ADAPTATIVO**
AÇÕES	**AÇÕES**	**AÇÕES**
Início Aprovar de maneira formal o projeto, compreendendo as metas, prioridades, prazos e riscos do projeto. Etapa com data certa para começar.	Cada atividade do projeto roda em fases ou iterações, promovendo melhor conhecimento sobre o produto a ser entregue.	2 tipos de modelos para este tipo de ciclo de vida: Modelo centrado no fluxo (kanban) OU Modelo centrado em ciclos iterativos e incrementais (Scrum).
Planejamento Programar e descrever as tarefas para atingir os objetivos do projeto, incluindo o cronograma a ser executado.	Ao final de cada iteração tem-se um ou vários entregáveis.	Para o modelo centrado no fluxo, a limitação é clara sobre a concorrência entre atividades (*work in progress*).
Execução dos Trabalhos Colocar o planejamento em ação, coordenando os recursos, incluindo a equipe.	Iterações futuras entregam melhorias do que foi entregue ou novos entregáveis.	Para o modelo em ciclos iterativos a duração varia entre 1 e 4 semanas (Sprint).
Monitoramento Realizar o controle do desempenho dos trabalhos, analisando o desenvolvimento e executando correções quando necessárias.	O Produto Final é o somatório de funcionalidades entregues.	
Encerramento Analisar os resultados, formalizando a concordância com os produtos, resumindo as informações e principais aprendizagens. Etapa com data certa para terminar.	Ciclo de vida curto.	

Figura 7: Quadro com as etapas de gerenciamento de um projeto e o resumo de suas principais atividades.

COMO TRATAR AS ETAPAS DE GERENCIAMENTO DE PROJETO NA ANM?

No intuito de disseminar a cultura de projetos na ANM, a proposta da área responsável é a de simplificar o máximo possível o processo de formatação de um projeto e o levantamento de seus dados para a formalização de um portfólio institucional e posteriormente monitoramento. Para tanto, propõe o uso de artefatos simplificados e disponibiliza instruções sobre algumas metodologias de gerenciamento de projetos, de forma que a instituição possa usar em seus projetos aquela que melhor se adapta às necessidades de cada equipe.

Ainda, a geração de um portfólio de projetos institucionais ou estratégicos é uma urgência, considerando que a partir dessa lista, recursos financeiros e pessoas serão remanejados com grau de assertividade maior do que praticado nos últimos tempos. Tais fatores, aliados ao aspecto tecnológico de alguns projetos, definem a capacidade ANM de execução de projetos. No momento em que a instituição reconhecer essas premissas, passará a ter maior chances de êxito em suas entregas.

- **INÍCIO:** Durante a iniciação, além da formalização da existência do projeto, é fundamental considerar o alinhamento com o plano de diretrizes e os objetivos estratégicos da organização, assim como a justificativa, os principais benefícios e produtos esperados.

  Nessa etapa devem ser identificados os objetivos, listadas as entregas/produtos principais, as atividades, as premissas, restrições, riscos, partes interessadas e estimativas de custos. O grau de detalhe nesta fase é pequeno, e a depender do tipo de informação necessária para um monitoramento efetivo e para ajuste de mudanças que porventura ocorram no projeto, a etapa de planejamento demandará mais detalhes do projeto.

  Na ANM, no lugar do TAP, será disponibilizado, um documento customizado chamado Termo de Abertura e Classificação de Projeto (TACP) (Anexo 1). Com a finalidade de permitir uma visão mais abrangente do projeto, esse documento, em forma de modelo, já inclui um plano de trabalho resumido.

  A classificação das informações iniciais dos projetos, em um determinado período de um ciclo estratégico é necessária, visto que os recursos humanos estão escassos e os recursos financeiros são limitados. Dessa maneira é possível demonstrar o que realmente poderá ser feito ou não em termos de projetos na organização, facilitando para uma prévia seleção e evitando, assim, desperdícios de tempo e dinheiro.

  A boa prática pede que um processo administrativo seja aberto (SEI) com a função de repositório das informações e artefatos utilizados sobre o projeto. Independentemente da metodologia, esse processo "burocrático" é

MINUTA

fundamental em futuras defesas contra tomadas de decisões durante a existência do projeto.

- **PLANEJAMENTO:** Para garantir o alcance dos objetivos dos projetos, e uma vez que existe um portfólio institucional aprovado, deve-se detalhar a proposta do projeto, incluindo o cronograma, riscos do projeto e estrutura analítica do projeto (EAP) a depender da metodologia a ser adotada.

A metodologia preditiva usa a organização da execução de partes do escopo do projeto de forma visual, hierárquica e em partes menores, na forma de uma EAP (estrutura analítica de projeto), que é um diagrama com a finalidade de auxiliar o gerenciamento das entregas e do projeto como um todo, de forma mais precisa (Figura 8). Na metodologia ágil, pode ser observada a estruturação das tarefas por sprint, por exemplo.

Figura 8: Exemplo de modelo de uma EAP.

Comentado [CP1]: @Maryanna Beserra de Almeida vamos ter que rever a formatação das figuras, pls.

Um cronograma é fundamental em qualquer projeto, pois é a ferramenta que descreve todas as atividades a serem realizadas na execução do projeto. O cronograma vai detalhar o que for necessário, em maior ou menor grau de detalhe, as tarefas que serão realizadas e o tempo que cada uma irá levar

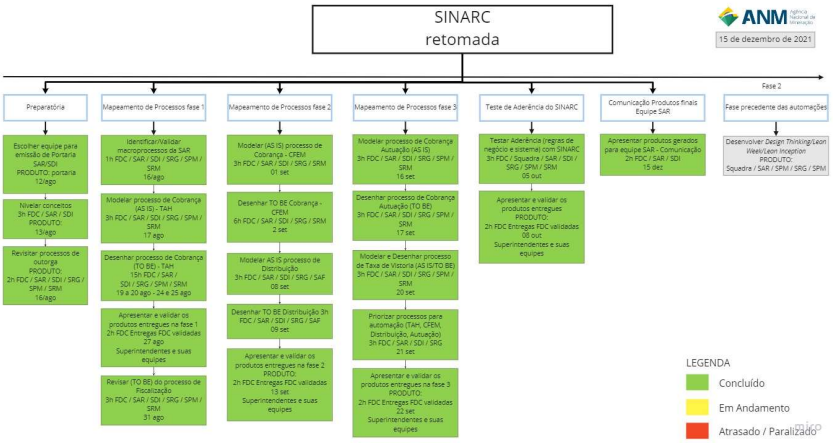

para acontecer, e pode ter outro aspecto a depender da metodologia utilizada (Figura 9).

ATIVIDADES	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
PRODUTO 1 (1.0)												
AÇÃO 1 (1.0.1)	X	X	X	X								
AÇÃO 2 (1.0.2)					X	X						
AÇÃO 3 (1.0.3)	X	X	X	X	X	X						
AÇÃO 4 (1.0.4)							X	X	X	X		
AÇÃO 5 (1.0.5)											X	X
PRODUTO 2 (2.0)												
AÇÃO 1 (2.0.1)			X	X								
AÇÃO 2 (2.0.2)					X	X						
AÇÃO 3 (2.0.3)					X	X	X					
AÇÃO 4 (2.0.4)								X	X	X	X	
AÇÃO 5 (2.0.5)												X

Figura 9: Quadro mostrando um modelo de cronograma e a identificação numérica de cada uma.

É importante incluir no planejamento o gerenciamento dos custos, das aquisições e da qualidade do produto. Portanto, o planejamento deve detalhar o que é preciso para que o projeto aconteça na prática.

- **MONITORAMENTO:** O monitoramento e o controle são procedimentos de prática de gestão, sendo produzido dados e informações internamente no projeto, o que permite conhecimento sobre o andamento dos projetos, analisando, por exemplo, se o prazo e orçamento estão de acordo com o proposto. Em seguida, essas mesmas informações ou conjunto de dados podem ser lançados ao nível gerencial tático-estratégico, o que permite a gestão em nível transversal à instituição.

Apesar das atividades de monitoramento ocorrerem mais intensamente durante a execução dos trabalhos, elas acontecem, na prática, ao longo de todo ciclo de vida do projeto.

- **ENCERRAMENTO:** Uma vez que houve o lançamento de um produto minimamente viável e utilizável, ou um produto final, pode-se considerar como encerrado o projeto. As fases subsequentes referem-se às melhorias evolutivas ou corretivas no caso de falhas. É importante também promover, nessa etapa, uma avaliação de forma ampla sobre o projeto, com intuito de gerar conhecimento e lições aprendidas. Pode ser necessário uma formalização/registro sobre o projeto. Por fim, um projeto pode ser cancelado ou suspenso por algum motivo, normalmente de natureza estratégica ou decisória de natureza gerencial em alto nível.

PROJETOS NO CONTEXTO DOS PLANOS EXECUTIVOS E DO PORTFÓLIO ANM

Na ANM, as ações são orientadas com base na missão, na visão de futuro e com estratégias definidas, que são ligadas a objetivos maiores presentes no Plano de Diretrizes. Esses objetivos são segmentados em objetivos estratégicos organizacionais nos Planos executivos e efetuados através do Portfólio de Projetos.

Dessa maneira, os projetos devem estar em consonância com o que foi abordado nos planos executivos e devidamente formalizados no portfólio ANM. Nesse contexto, cada projeto deve produzir resultados que entregam valor para instituição, atingindo ou colaborando para o atingimento de, pelo menos, um objetivo estratégico organizacional.

Esses objetivos devem apontar para as ações e medidas que devem acontecer, em especial as deliberações e alocações de recursos, a fim de atingir os resultados estratégicos propostos.

Na abordagem do gerenciamento de projeto ANM, a descrição do projeto se dará por meio do artefato TERMO DE ABERTURA E CLASSIFICAÇÃO DE PROJETO, a ser indicado no Anexo 1 e seguido de uma proposta de artefato para cronograma, EAP e custos no Anexo XXXXXX

MINUTA

Os dados contidos no artefato de cronograma, EAP e custos são utilizados ao longo do monitoramento, a fim de analisar o desdobramento dos projetos, controlando o desempenho das ações e resultados parciais dos trabalhos, e, quando necessário, efetuando reparações. Esses monitoramentos serão disponibilizados na *intranet* através da página de projetos no *Sharepoint*.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O principal fato que deve ser considerado para gerenciar projetos é que são pessoas que fazem o projeto acontecer, então, um bom gerenciamento precisa atentar para uma boa integração e comunicação entre as partes interessadas. Do contrário, o projeto terá grandes chances de fracassar.

Outra condição aconselhável é que as pessoas que compõem a equipe do projeto estejam ligadas às áreas de interesse pela execução ou pelo produto/serviço do projeto, possuindo conhecimento e habilidades necessárias para execução do trabalho de forma que a habilidade e competência de cada um venha a somar e colaborar.

A partir dessa premissa, é fundamental a aplicação de técnicas e conhecimentos nas ações de gerenciamento de projeto, de forma eficaz e eficiente, para que se gere cumpra os seus resultados com ganhos palpáveis e, consequentemente, que contribuam para com o cumprimento dos objetivos estratégicos institucionais.

Para realizar um gerenciamento de projeto eficaz e eficiente, é fundamental destacar algumas características de um projeto com maiores chances de êxito. Em função disso, seguem abaixo algumas qualidades de um projeto bem-sucedido:

- ✓ Entregar todos os produtos conforme planejado, incluindo com qualidade;
- ✓ Realizar dentro do prazo determinado;
- ✓ Usar o orçamento inicialmente estipulado;
- ✓ Atingir suas metas e objetivos;
- ✓ Entregar determinações técnicas, legais, funcionais de acordo com o esperado;
- ✓ Não provocar nenhum impacto negativo;
- ✓ Alcançar pelo menos um objetivo estratégico institucional.

MINUTA

Todavia, deve-se ter em mente que cada organização pode e deve fazer uma adaptação das metodologias disponíveis, customizando, entre outras coisas, seus critérios de priorização de projetos de acordo com sua realidade e recursos disponíveis.

MINUTA

Edifício CNC III – SBN Quadra 2, Bloco N

Brasília – DF/Asa Norte

atendimento@anm.gov.br

(61) 3312-6611
